Publizierbarer Endbericht

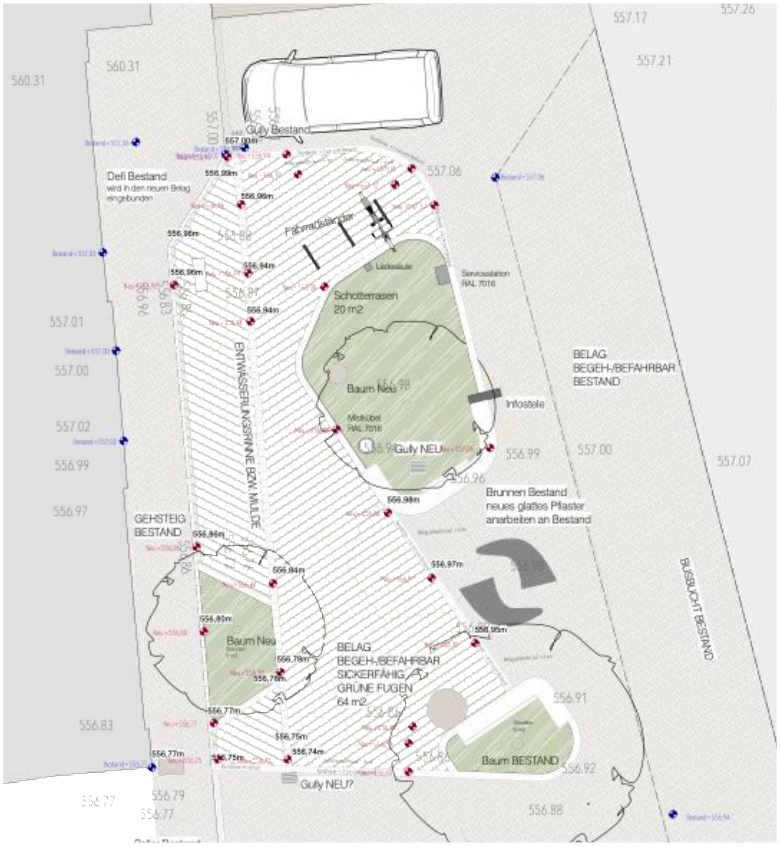
Gilt für die Programmlinie KLAR! Invest der Klimawandelanpassungsmodellregionen

A) Projektdaten

Allgemeines zum Projekt	
Projekttitel:	Cooler Hauptplatz Eisenkappel
Programm:	KLAR! Invest
Projektdauer:	01.11.2025 bis 01.11.2026
KLAR!-Region:	Südkärnten
Projektphase:	WF II
Antragsteller:in:	Verein KEM Südkärnten
Kontaktperson Name:	Reinhard Schildberger
Kontaktperson Adresse:	Klagenfurter Str. 10 9100 Völkermarkt
Kontaktperson Telefon:	066473026986
Kontaktperson E-Mail:	reinhard.schildberger@lag-uk.at
Themenfeld:	☒ Hitzeschutz ☒ Wassermanagement
Projektgesamtkosten:	52.920,32 €
Fördersumme:	39.690,24 €
Klimafonds-Nr.:	KC505201
Erstellt am:	08.05.2025
Weiterführende Infos (falls vorhanden)	Hier Link einfügen

B) Projektübersicht

Synopsis: **Max. 250 Zeichen inkl. Leerzeichen**	Entsiegelungsmaßnahmen am Hauptplatz Bad Eisenkappel zur Verbesserung der Regenwasserversickerung, des Baumwachstums der bestehenden Bäume und zusätzliche Beschattung durch einen neuen weiteren Baum. Reparatur des Trinkbrunnen für die Wasserversorgung am Platz
Kurzbeschreibung: **Max. 7.500 Zeichen inkl. Leerzeichen**	Der mit zwei Kandelaber-Platanen bestandene Platz war bisher voll versiegelt, die Baumstämme wiesen nur winzige, erhöhte Baumscheiben auf, die keinen Regenwasserzufluss zu den Bäumen ermöglichten. Ein Baumgutachten ergab, dass die Bäume sehr stark unter dieser Situation leiden. Ziele des Projekts waren: • Verbesserung der Baumscheiben um eine Erholung und weitere gute Entwicklung der beiden Bestands-Bäume ermöglichen. Umwandlung in großzügige, sickerfähige, begrünte Baumscheiben. • Verbesserung des Regenwasserzuflusses in die Baumscheiben durch Änderung der Belagshöhen • Schaffung einer dritten Baumscheibe für einen neuen, klimatoleranten Baum (dieser wurde aus anderen Fördermitteln finanziert). • Verbesserung der Regenwasserversickerung in der Fläche zur Entlastung des Oberflächenwasserkanals. • Erhöhung der Verdunstungsleistung durch Schaffung begrünter Bereiche (Schotterrasen, Staudenbeete, teil-sickerfähiges Grünfugenpflaster). • Austausch des Trinkbrunnens (Anm.: im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass der bestehende Trinkbrunnen durch Ausbau und Reinigung repariert werden konnte).

	Im Rahmen des Projektes konnten 77 m2 Fläche zusätzlich zu einem bestehenden Projekt entsiegelt werden. Die Flächen setzen sich aus drei großzügigen Baumscheiben mit 36 m2 und sickerfähigem Grasfugenpflaster mit 41 m2 zusammen. Das geplante Vorhaben musste mehrmals umgeplant werden, da die Kosten der nach der Förderzusage ausgeschriebenen Baumeisterleistungen das Budget überschritten hatte, die Quadratmeteranzahl der geplanten Maßnahmen konnte jedoch gehalten werden. Der Ausführungszeitraum musste auf Herbst 2026 verschoben werden, konnten jedoch bis Ende Oktober 2026 umgesetzt werden.  Außerhalb des KLAR-Invest-Programmes wurden Möblierungen vorgenommen: Fahrradständer, Radlade- und Servicestation, Mistkübel, Sitzbänke.
Anpassungsrelevanz und Empfehlungen **Max. 5.000 Zeichen inkl. Leerzeichen**	• Erhöhung der Regenwasserversickerung • Speicherung des Regenwassers für spätere Verdunstung durch Bäume, Blühstauden und Gräser

	• Verbesserung des Mikroklimas im öffentlichen Raum • Erhöhung der natürlichen, kühlenden Beschattung • Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch einen ansprechenden öffentlichen Grünraum. • Entsiegelung von 77 m2 (in diesem Projekt) bzw. 107 m2 gesamt. • Trinkwasserversorgung am Platz
Zeitplan:	• Herbst 2025: Planungsarbeiten mit mehreren Abstimmungsrunden mit Entscheidungsträger:innen und Stakeholder:innen • Winter/Frühjahr 2026: Ausschreibung gem. Bundesvergabegesetz, erste Angebote, die das Budget stark überschritten. • Umplanung zur Reduktion der Kosten in drei Schleifen • Sommer 2026: Vergabegespräche, Beauftragung Fa. Mawi Bau • Ausführungsdetails planen • September 2026: Baubeginn, Abbrucharbeiten, Entsiegelung, Randeinfassungen, Sickerfähiges Pflaster, Brunnenreparatur • Oktober 2026: Erd- und Humusierungsarbeiten, Bepflanzung, Ansaat

Dieser gesamte Projektbericht wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung dieses gesamten Projektberichts, übernimmt der Klima- und Energiefonds keine Haftung.

Die Fördernehmerin/der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung dieses gesamten Projektberichts ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie unwiderrufliche Recht einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukünftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die Fördernehmerin/der Fördernehmer den Klima- und Energiefonds vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.
